



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



"MT-2309010.- CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDADES RURALES RUTA 2 (YAXCHE, HONDZONOT, CHANCHEN
Obra: PALMAR)"

Localidad: VARIAS


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DOGYSPM/COPLP/029/FISM-DF/BEN/2019


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	Avance Programado	Avance Fisico	Por ejecutar
-------	---------	------------	-------------------	---------------	--------------

PERIODO: DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
35 DIAS DE EJECUCION

Avance Programado: 100 %
 Avance Fisico: 100 %
 Por ejecutar: 0 %

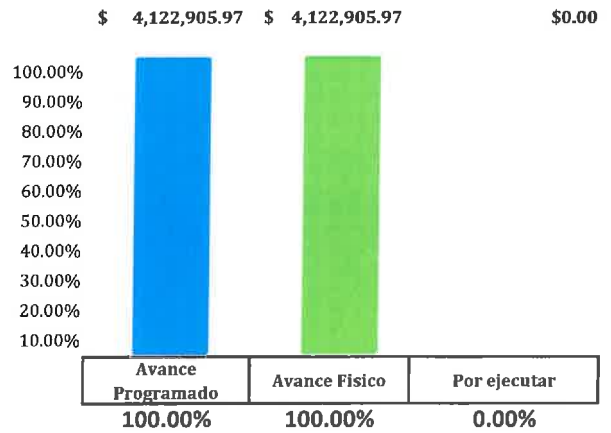

Avance Programado: 100 %
 Avance Financiero: 100 %
 Por ejecutar: 0 %

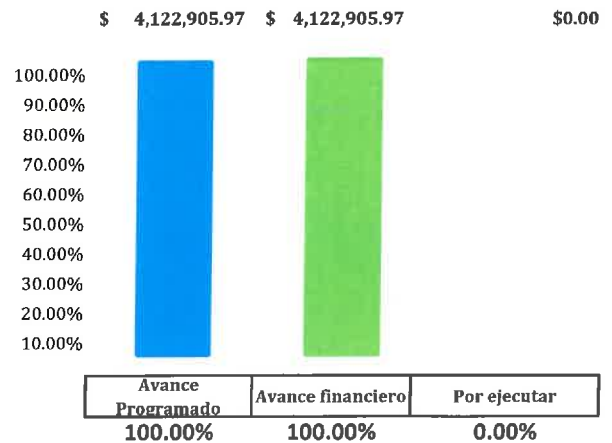

ELABORÓ

ING. ALMA K. ELIZALDE MOO
RESIDENTE DE OBRA
