



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA EJIDO DEL MUNICIPIO DE TULUM

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/042/RP/2019


REPORTE SEGUNDO

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

1.00	TERRACERIA	\$ 1,124,653.54	\$ 1,124,653.54	0.00
2.00	PAVIMENTACION	\$ 2,318,006.91	\$ 2,318,006.91	0.00

\$ 3,442,660.45	\$ 3,442,660.44	\$ -
\$ 550,825.67	100.00%	0.00%
\$ 3,993,486.12		

Avance Físico

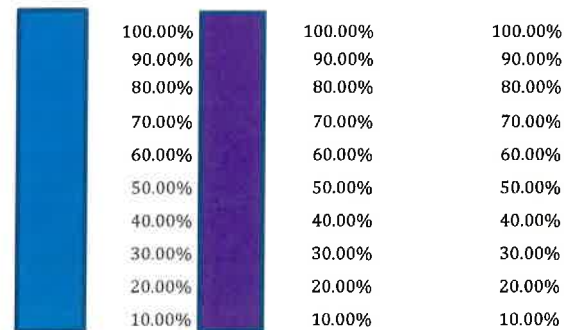

Ejecutado: 100.00%

Avance Financiero



PAGADO 30.00%

ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA
