



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO

Obra:

GUERRA DE CASTAS DEL MUNICIPIO DE TULUM

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/043/RP/2019

REPORTE SEGUNDO

| CLAVE | PARTIDA | CONTRATADO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
|-------|---------|------------|-----------|--------------|
|-------|---------|------------|-----------|--------------|


| | | | | |
|---|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| A | PRELIMINARES | \$ 74,251.67 | \$ 74,251.67 | 0.00 |
| B | TERRACERIAS | \$ 959,332.32 | \$ 959,332.32 | |
| C | ALBAÑILERIA | \$ 99,890.36 | \$ 99,890.36 | 0.00 |
| D | PAVIMENTOS | \$ 1,446,485.47 | \$ 1,446,485.47 | |
| | | \$ 2,579,959.82 | \$ 2,579,959.82 | \$ - |
| | | \$ 412,793.57 | 100.00% | 0.00% |
| | | \$ 2,992,753.39 | | |

Avance Físico

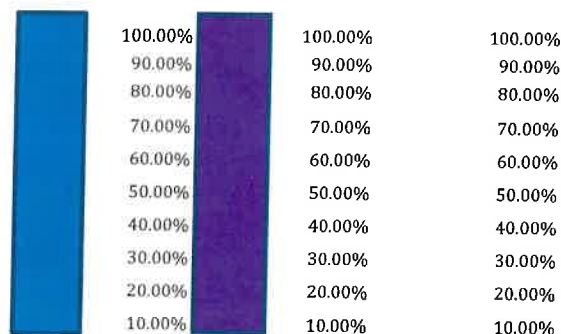

**Ejecutado:
100.00%**

Avance Financiero

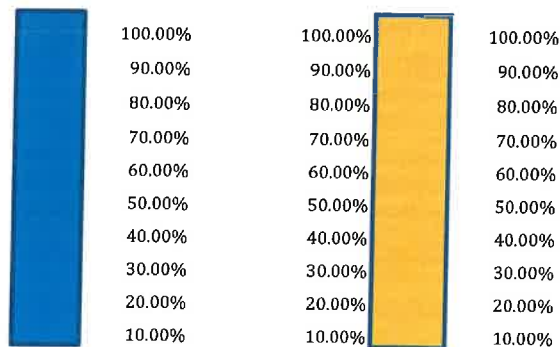

**PAGADO
0.00%**

ELABORO:

P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA
