



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**




Obra: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA
REGIÓN 1 EN EL MUNICIPIO DE
TULUM
Localidad: FRANCISCO UH MAY
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO
Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/045/RP/2019 REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


A	TERRACERIAS	\$ 775,637.55	\$ 775,637.55	0.00
B	PAVIMENTOS	\$ 2,241,947.50	\$ 2,241,947.50	0.00
EXT.	EXTRAORDINARIOS	\$ 200,819.28	200819.28	0

\$ 3,218,404.33	\$ 3,218,404.33	\$ -
\$ 514,944.70	100.00%	0.00%
\$ 3,733,349.03		

Avance Físico

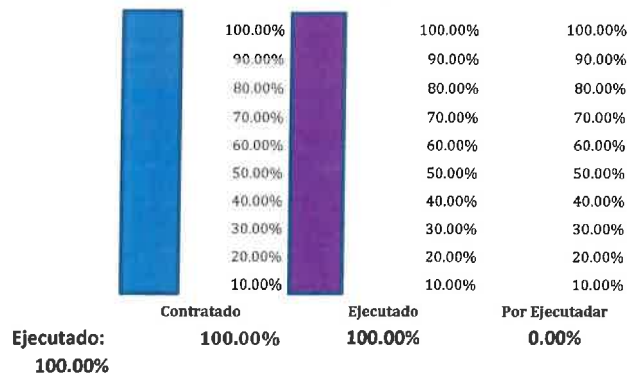

Avance Financiero

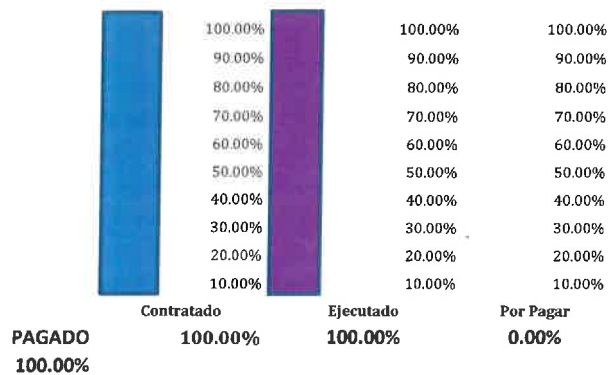

ELABORÓ

C. ROGER VALERIO PAT POOT
RESIDENTE DE OBRA
