



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGION 4  
SEGUNDA ETAPA. DEL MUNICIPIO DE TULUM"

Localidad: TULUM


REPORTE

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPAD/046/RP/2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
/	"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGION 4 SEGUNDA ETAPA. DEL MUNICIPIO DE TULUM"			
A	PRELIMINARES	\$ 430,190.17	\$ 430,190.17	0.00
B	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 2,322,331.50	\$ 2,322,331.50	0.00
TOTAL PRELIMINARES		\$ 430,190.17	\$ 430,190.17	
TOTAL GUARNICIONES Y BANQUETAS		\$ 2,322,331.50	\$ 2,322,331.50	0.00
		\$ 2,752,521.67	\$ 2,752,521.67	\$ -
IVA 16%		\$ 440,403.47		
TOTAL GUARNICIONES Y BANQUETAS		\$ 3,192,925.14		

**100.00%**      **0.00%**  
Avance Físico

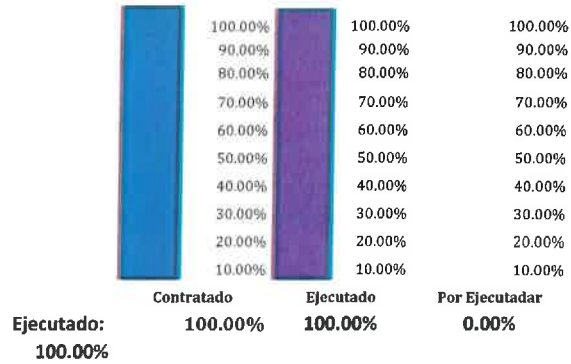

Avance financiero.

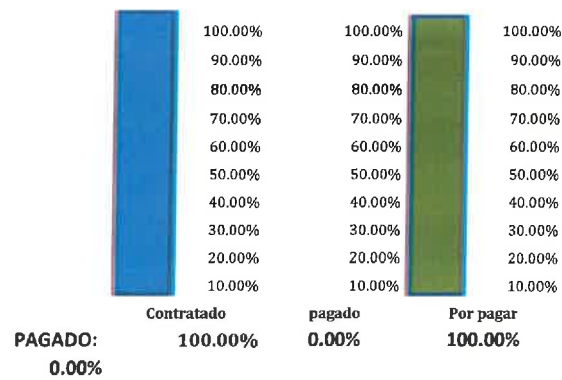

ELABORO:   
P.ING. ALEJANDRO CIAU  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
