

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



**TULUM**

TULUM, QUINTANA ROO 17 de AGOSTO de 2022

MT-DGP-2309001.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE  
Obra: SANITARIO DE LA AV. TULUM (JUPITER SUR AV. KUKULKÁN), LADO SUR



Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/011/FISMDF/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
1.00	PRELIMINARES	\$ 93,855.92		
2.00	EXCAVACIÓN	\$ 438,101.23		
3.00	PLANTILLAS	\$ 8,225.95		
4.00	SUMINISTRO DE TUBERIAS	\$ 71,459.34		
5.00	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	\$ 48,399.70		
6.00	RELLENOS	\$ 106,888.33		
7.00	POZO DE VISITA	\$ 28,403.29		
8.00	INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA	\$ 20,374.47		
9.00	TAPA Y BROCAL	\$ 38,484.80		
10.00	MANGA DE EMPOTRAMIENTO	\$ 4,862.22		
11.00	DESCARGAS SANITARIAS	\$ 597,311.49		
12.00	COMPLEMENTARIOS	\$ 42,164.66		

TOTAL:	\$ 1,498,531.40	\$ -
IVA 16 %	\$ 239,765.02	0%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1,738,296.42</b>	

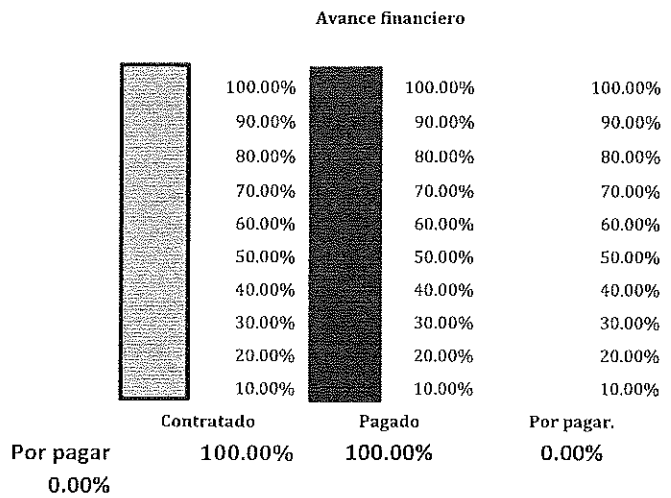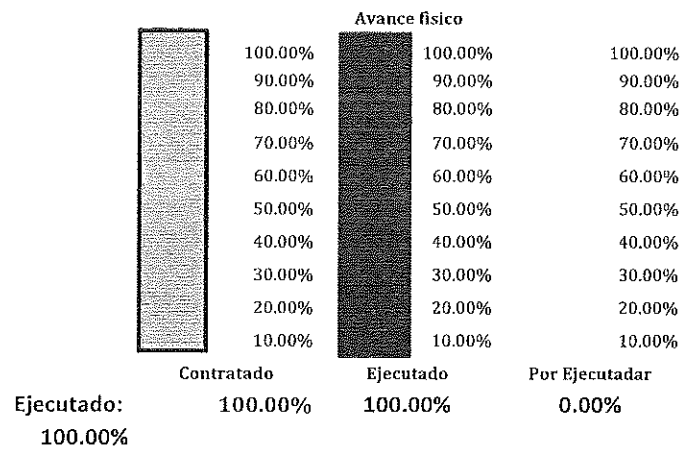

ELABORO:

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
