



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



**TULUM**

Obra: MT-DGP-2309013.-AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY

Localidad: FRANCISCO UH MAY

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/032/FISMDF/2022

Conv. Modif.

**REPORTE**

FECHA 24/12/2022

CONTRATO 26 de septiembre a 24 de diciembre de 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	-----------------	--------------

MT-DGP-2309013.-AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY

A	PRELIMINARES	\$ 51,893.72	\$ 51,893.72	\$ 51,893.72	0.00
B	CIMENTACION	\$ 173,279.21	\$ 173,279.21	\$ 173,279.21	0.00
C	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	\$ 779,714.01	\$ 779,714.01	\$ 779,714.01	0.00
D	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 805,644.01	\$ 805,644.01	\$ 805,644.01	0.00
E	ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE AZOTEA	\$ 227,153.90	\$ 227,153.90	\$ 227,153.90	0.00
F	INSTALACION ELECTRICA	\$ 461,969.33	\$ 461,969.33	\$ 461,969.33	0.00
G	INSTALACION HIDRAULICAS	\$ 93,632.64	\$ 93,632.64	\$ 93,632.64	0.00
H	INSTALACION SANITARIAS	\$ 374,066.47	\$ 374,066.47	\$ 374,066.47	0.00
I	CARPINTERIA, CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 648,816.33	\$ 648,816.33	\$ 648,816.33	0.00
J	ANDADORES	\$ 22,964.63	\$ 22,964.63	\$ 22,964.63	0.00


\$ 3,639,134.25 \$ 3,639,134.25 \$ 3,639,134.25 \$ -

TOTAL AMPLIACION \$ 3,639,134.25 \$ 3,639,134.25 \$ 3,639,134.25 \$ -


\$ 3,639,134.25	\$ 3,639,134.25	\$ 3,639,134.25	\$ -
\$ 582,261.48	100.00%	100.00%	0.00%
\$ 4,221,395.73			

TOTAL AMPLIACION

**Avance Físico**

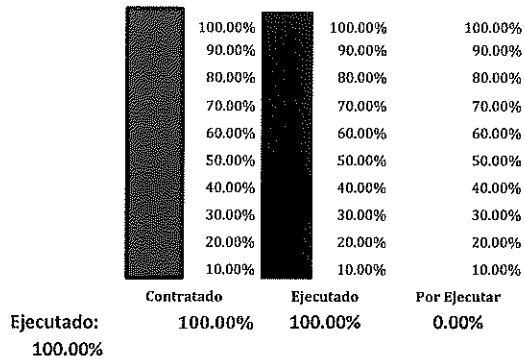

**Avance Financiero**

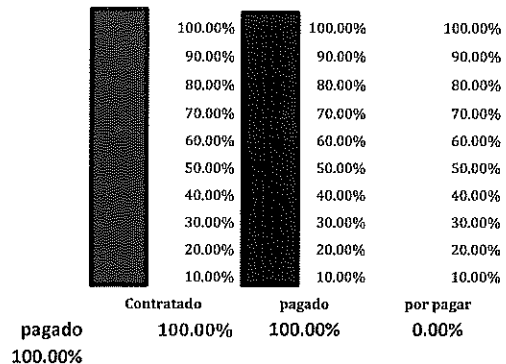

ELABORO:  
P. ING. GERARDO ANGUIANO HERNANDEZ  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
