



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA MAYA (TRAMO: YAXCHE-CHANCHEN PALMAR)

TULUM QUINATANA ROO A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Localidad: YAXCHE-CHANCHEN PALMAR

PERIODO DE EJECUCION 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/002/2023


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 503,667.06	\$ 503,667.06	
B	REPAVIMENTACION	\$ 4,875,825.47	\$ 4,875,825.47	
C	SEÑALETICA HORIZONTAL	\$ 1,510,044.00	\$ 1,510,044.00	

SUBTOTAL \$	6,889,536.51	\$6,889,536.51
16% I.V.A	\$1,102,325.84	\$1,102,325.84
TOTAL \$	7,991,862.35	\$ 7,991,862.35
	100%	15%

Avance Físico

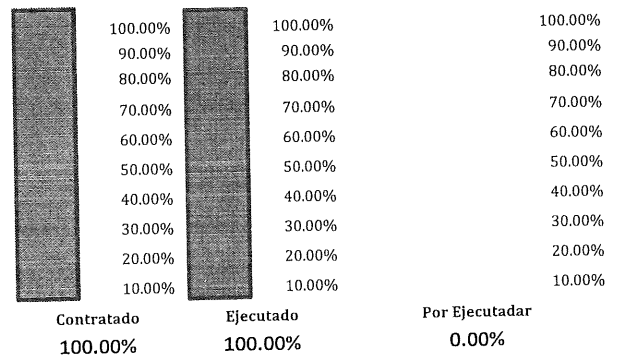

Avance Financiero

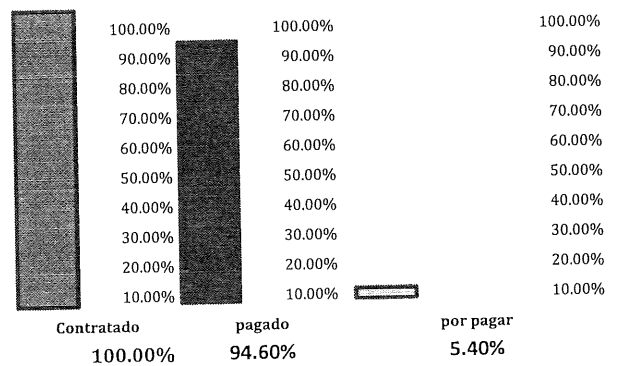

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
