



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



MT-DGPM-2309010.- CONSTRUCCIÓN DE
Obra: GUARNICIONES, BANQUETAS, POZOS DE ABSORCIÓN
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL

Localidad: AKUMAL, QUINTANA ROO


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/011/2024


PERIODO DE EJECUCION: 20 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2024

TULUM QUINTANA ROO A 24 DE JUNIO 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A.	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	\$ 1,128,559.95000	\$ -	\$ 1,128,559.95000
B	BANQUETAS Y GUARNICIONES	\$ 3,001,296.96000	\$ -	\$ 3,001,296.96000
		\$ 4,129,856.91	\$ -	\$ 4,129,856.910
		\$ 660,777.11	\$ -	\$ 660,777.11
		\$ 4,790,634.02	\$ -	\$ 4,790,634.020

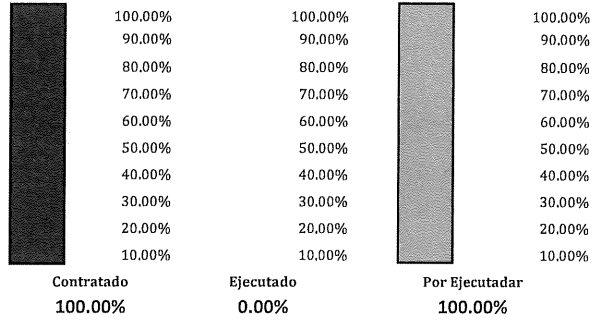

Avance Financiero

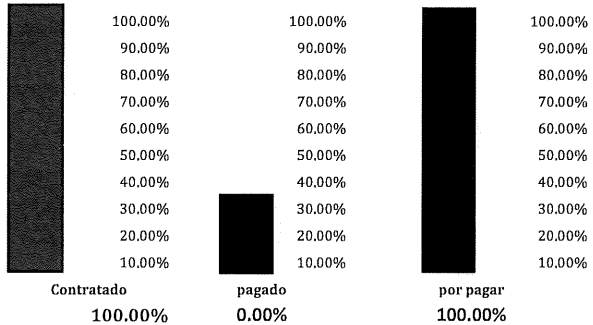

ELABORÓ:

ING. ANA VICTORIA LARA NOYA
RESIDENTE DE OBRA
