



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGPM-2309006.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA XUL-KAA

Localidad: TULUM, QUINTANA ROO


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/006/2024.


PERIODO DE EJECUCION: 02 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2024

TULUM QUINTANA ROO A 24 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A.	PRELIMINARES	\$ 182,467.83000	\$ 182,467.83000	-
B	ANDADORES	\$ 386,779.48000	-	386,779.48000
C	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 1,082,373.06000	\$ 728,330.38000	354,042.68000
D	LUMINARIAS	\$ 492,380.31000	\$ 24,619.01550	467,761.29450
		\$ 2,144,000.68	\$ 935,417.23	1,208,583.450
		\$ 343,040.11	\$ 149,666.76	193,373.35
		\$ 2,487,040.79	\$ 1,085,083.98	1,401,956.800

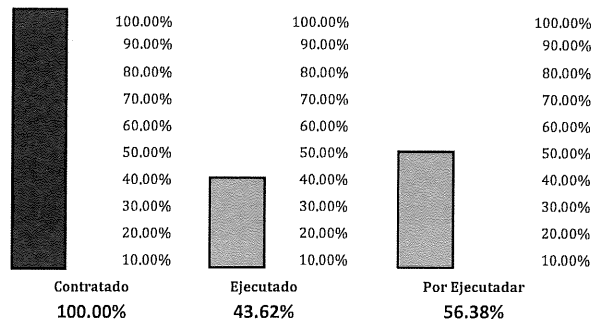

Avance Financiero

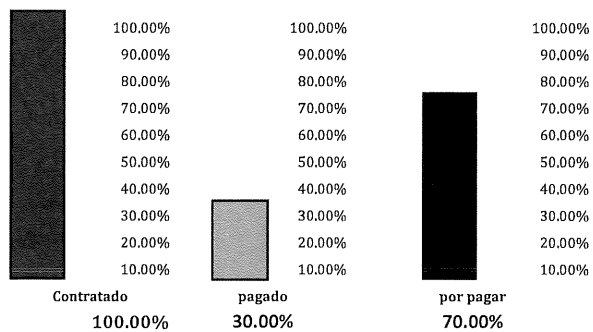

ELABORÓ:

ING. ANA VICTORIA LARA NOYA
RESIDENTE DE OBRA
