



RECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



OBRA : MT-2309005.-CONSTRUCCION DE DOMO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYTE), PLANTEL TULUM



LOCALIDAD: TULUM.

MUNICIPIO : TULUM, QUINTANA ROO

CONTRATO : HAT/DGOYSPM/COPLP/012/FORTAMUNDF/2020

CLAVE	PARTIDA	REPORTE		
		CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A)	PRELIMINARES \$	22,088.74	\$ 22,088.74	0.00
B)	CIMENTACION \$	194,911.26	\$ 161,736.07	33,175.19
C)	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA \$	153,748.96	\$ 79,094.08	74,654.88
D)	ESTRUCTURAS DE ACERO Y CUBIERTA \$	1,498,490.46	\$ 933,498.04	564,992.42
E)	INSTALACIONES ELCTRICAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS \$	69,565.25		69,565.25
F)	MUEBLES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO \$	176,975.30		176,975.30
G)	ACABADOS \$	266,763.88		266,763.88

SUBTOTAL :	\$ 2,382,543.85	\$ 1,196,416.93	1,186,126.92
I.V.A. :	\$ 381,207.02	\$ 191,428.71	\$ 189,780.31
TOTAL :	\$ 2,763,750.87	\$ 1,387,843.84	\$ 1,376,907.23

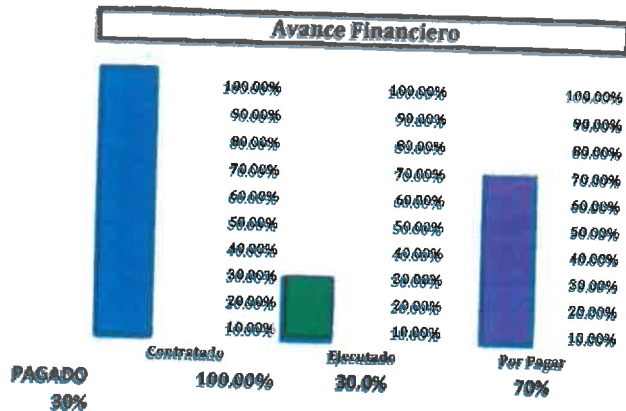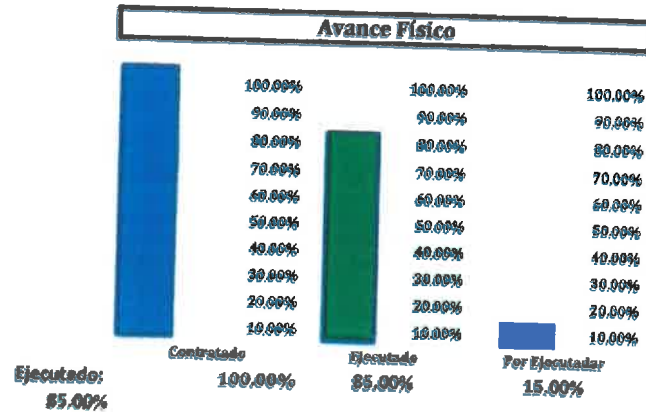

ELABORÓ

*C. ROBERTO VALERIO PAT FOOT*  
RESIDENTE DE OBRA
