



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. O "KOT"
 DE LA LOCALIDAD DE TULUM"

Localidad: TULUM, QUINTANA ROO
 Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

REPORTE

Contrato: HAT/DOOTEPM/COPLP/062/09/2020

FECHA: 16/09/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EXECUTADO	POR EXECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. O "KOT"
 DE LA LOCALIDAD DE TULUM"

A	PRELIMINARES	\$ 110,245.29	\$ 74,961.74	\$ 35,403.55
B	GUARNICIONES Y BANQUETA	\$ 2,817,448.14	\$ 1,809,861.20	\$ 1,008,586.94
C	PINTURA	\$ 283,893.76		\$ 283,893.76


TOTAL GUARNICION Y BANQUETA	\$ 3,211,607.19	\$ 1,883,722.94	\$ 1,008,586.94
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTAL GUARNICION Y BANQUETA	\$ 3,211,607.19	\$ 1,883,722.94	\$ 1,008,586.94
	\$ 513,857.15	33.74%	57.42%
	\$ 3,725,464.34		

Avance Físico

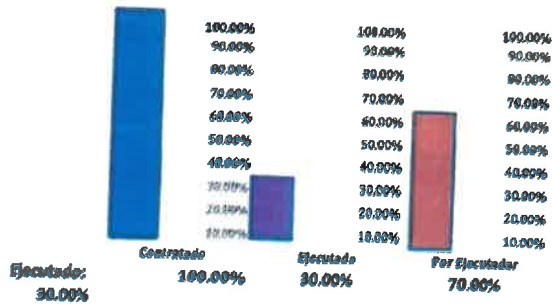

Avance Financiero

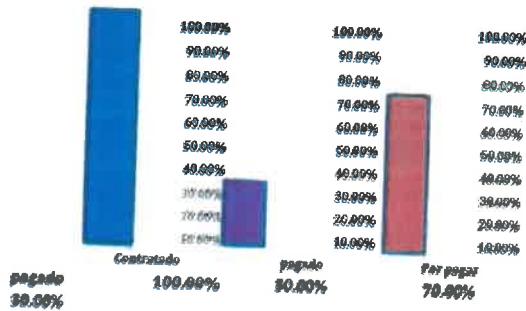

[Signature]
 P. ING. GABRIEL FRANCISCO PEREZ ARCEO
 RESIDENTE DE OBRA.
