



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TULUM

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/009/RP/2019


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	Avance Programado	Avance Fisico	Por ejecutar
DEL 29 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
45 DIAS DE EJECUCION					

I CONSTRUCCION DE CANCHA DE PADEL

A	PREELIMINARES	\$ 4,354.35	\$ 4,354.35	\$ 4,354.35	\$0.00
B	CIMENTACION	\$ 39,635.42	\$ 39,635.42	\$ 39,635.42	\$0.00
C	TERRACERIA Y PASTO SINTETICO	\$ 309,928.49	\$ 309,928.49	\$ 309,928.49	\$0.00
D	PANEL DE VIDRIO	\$ 393,123.00	\$ 393,123.00	\$ 393,123.00	\$0.00
E	ILUMINACION	\$ 46,655.60	\$ 46,655.60	\$ 46,655.60	\$0.00
F	HERRERIA	\$ 63,892.01	\$ 63,892.01	\$ 63,892.01	\$0.00

\$857,588.87	\$857,588.87	\$857,588.87	\$0.00
--------------	--------------	--------------	--------

■ Avance Programado: 100 %
■ Avance Fisico: 100 %
■ Por ejecutar: 0 %

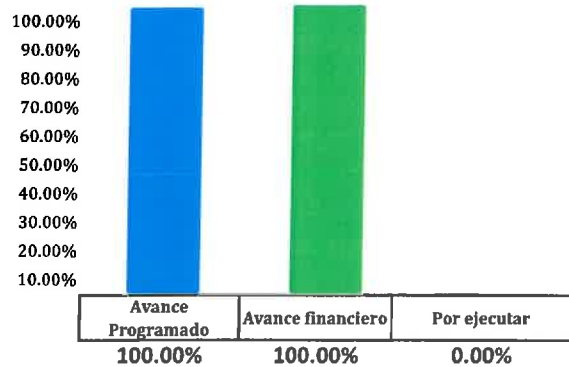

ELABORÓ

ING. ALMA K. ELIZALDE MOO
 RESIDENTE DE OBRA
