



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO  
AY."

Localidad: MANUEL ANTONIO AY

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/010/RP/2019


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

**I CONSTRUCCION DE DOMO**


A	PRELIMINARES	\$ 29,689.76	\$ 29,689.76	
B	CIMENTACION	\$ 147,656.25	\$ 147,656.25	
C	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	\$ 256,332.71	\$ 256,332.71	
D	ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA	\$ 1,254,291.12	\$ 1,254,291.12	
E	INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$ 43,264.24	\$ 43,264.24	
F	MUEBLES, ACCESORIOS Y EQUIPAMENTO	\$ 101,550.30	\$ 101,550.30	
G	ACABADOS	\$ 311,861.15	\$ 311,861.15	
I	RAMPAS	\$ 4,138.00	\$ 4,138.00	

\$ 2,148,783.53	\$ 2,148,783.53	\$ -
\$ 343,805.36	100.00%	0.00%
\$ 2,492,588.89		

Avance Físico

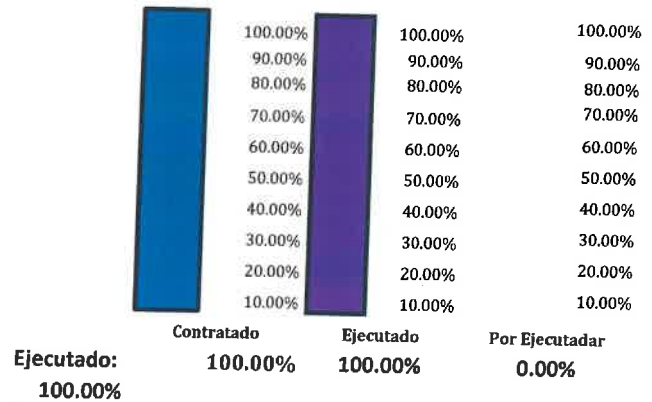

AVANCE FINANCIERO

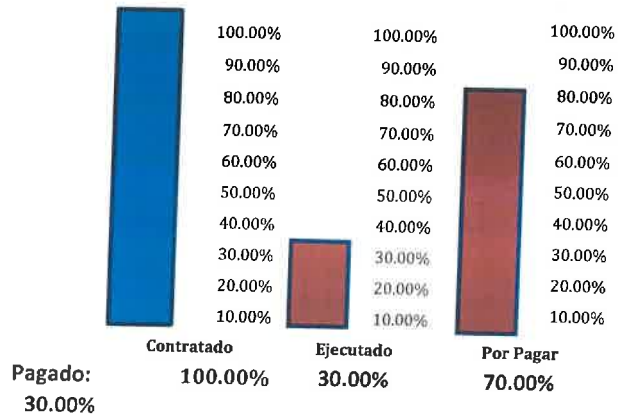

ELABORO:

ING. BENJAMÍN CHAN MAY  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
