



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA).

Localidad: TULUM

ESTIMACION 1


000931

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/051/RP/2018

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
I	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL (PLANTA			
A	DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES	\$ 24,937.07	\$ 21,217.65	3,719.42
B	INSTALACION ELECTRICA	\$ 75,562.76	\$ 75,562.76	0.00
C	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 28,031.85	\$ 28,031.85	0.00
D	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 232,905.69	\$ 223,189.04	9,716.65
E	TRABAJO DE TABLA-ROCA	\$ 44,519.49	\$ 44,519.49	0.00
F	CARPINTERÍAS	\$ 305,443.43	\$ 154,676.55	150,766.88
G	CRISTALES Y ESPEJOS	\$ 22,368.52	\$ 16,617.49	5,751.03
H	HERRAJES	\$ 16,578.50	\$ 16,578.50	0.00

\$ 750,347.31 \$ 580,393.33 \$ 169,953.98
 \$ 120,055.57 77.35% 22.65%
 \$ 870,402.88

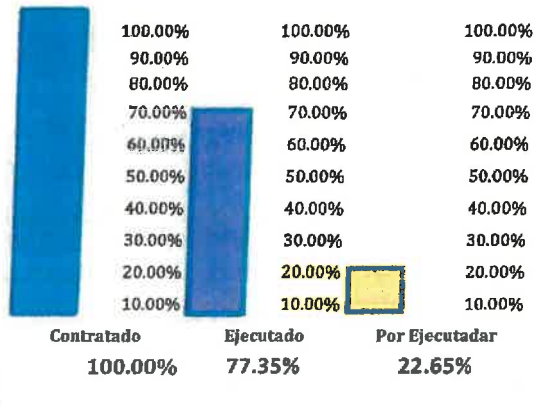

ELABORO:

ARQ. ZENAIDA JAIMES DURAN.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA).

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/051/RP/2018

ESTIMACION 2


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

001070

J REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL (PLANTA

A	DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES	\$ 24,937.07	\$ 24,937.07	0.00
B	INSTALACION ELECTRICA	\$ 75,562.76	\$ 75,562.76	0.00
C	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 28,031.85	\$ 28,031.85	0.00
D	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 232,905.69	\$ 232,905.69	0.00
E	TRABAJOS DE TABLA-ROCA	\$ 44,519.49	\$ 44,519.49	0.00
F	CARPINTERÍAS	\$ 305,443.43	\$ 305,443.43	0.00
G	CRISTALES Y ESPEJOS	\$ 22,368.52	\$ 22,368.52	0.00
H	HERRAJES	\$ 16,578.50	\$ 16,578.50	0.00

\$	750,347.31	\$	750,347.31	\$	-
\$	120,055.57		100.00%		0.00%
\$	870,402.88				

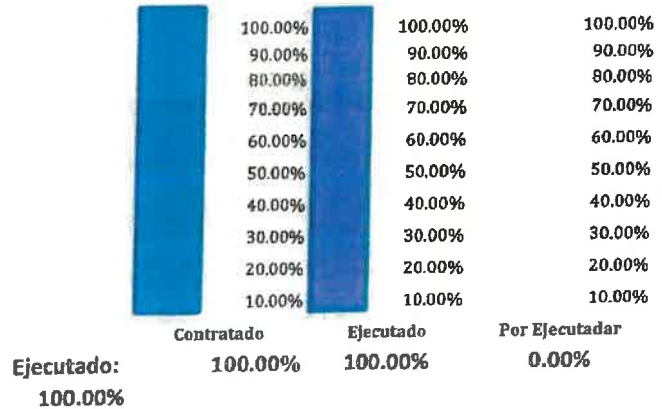

ELABORO:

ARQ. ZENAIDA ALVAREZ DURAN.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
