



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: MT-2309001.-MODERNIZACIÓN DE RED ELECTRICA AV TULUM


Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/003/FISM-DF/2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	Avance Programado	Avance Fisico	Por ejecutar
DEL 11 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019					
40 DIAS DE EJECUCION					
I MODERNIZACION DE RED ELECTRICA AV TULUM					
A	DESMANTELAMIENTO	\$ 106,902.00	\$ 106,902.00	\$ 106,902.00	0.00
B	REHABILITACION DE SERVICIOS DE BAJA TENSION	\$ 23,466.60	\$23,466.60	\$23,466.60	0.00
C	OBRA ELECTRICA	\$ 890,598.17	\$ 890,598.17	\$ 890,598.17	0.00
D	RED AEREA DE MEDIA TENSION	\$ 39,913.48	\$ 39,913.48	\$ 39,913.48	0.00
E	TRAMITES Y LIBRANZA	\$ 214,771.68	\$ 214,771.68	\$ 214,771.68	0.00
		\$ 1,275,651.93	\$1,275,651.93	\$1,275,651.93	\$0.00

■ Avance Programado: 100 %
■ Avance Fisico: 100 %
■ Por ejecutar: 0 %

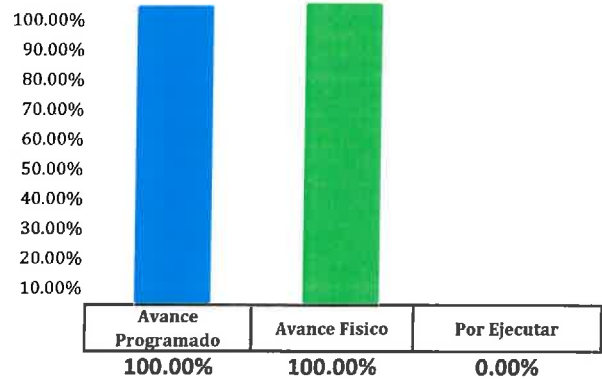

■ Avance Programado: 100 %
■ Avance Financiero: 100 %
■ Por ejecutar: 0 %

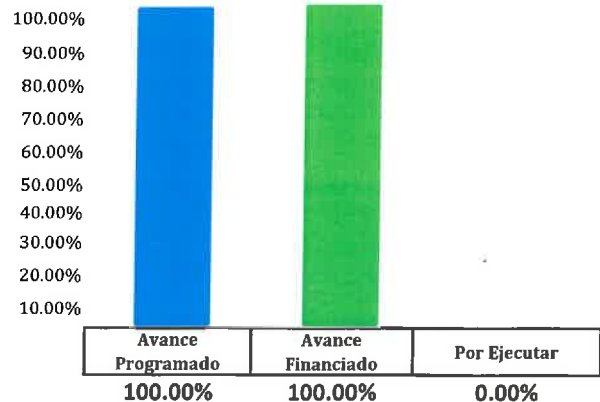

ELABORÓ

ING. ALMA K. ELIZALDE MOO
RESIDENTE DE OBRA
