



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "ORDENAMIENTO VIAL AV. TULUM"

Localidad: TULUM



REPORTE

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/012/RP/2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
/	"ORDENAMIENTO VIAL AV. TULUM"			
A	PRELIMINARES	\$ 222,306.93	\$ 222,306.93	0.00
B	PASO PEATONAL	\$ 1,061,219.44	\$ 1,061,219.44	0.00
C	SEÑALIZACION VERTICAL	\$ 147,190.06	\$ 147,190.06	0.00
D	SEÑALIZACION HORIZONTAL	\$ 891,982.86	\$ 891,982.86	0.00

\$ 2,322,699.29	\$ 2,322,699.29	\$ -
\$ 371,631.89	100.00%	0.00%
\$ 2,694,331.18		

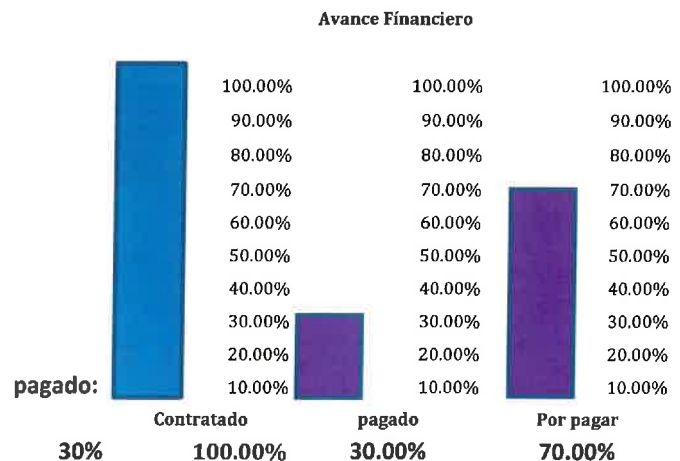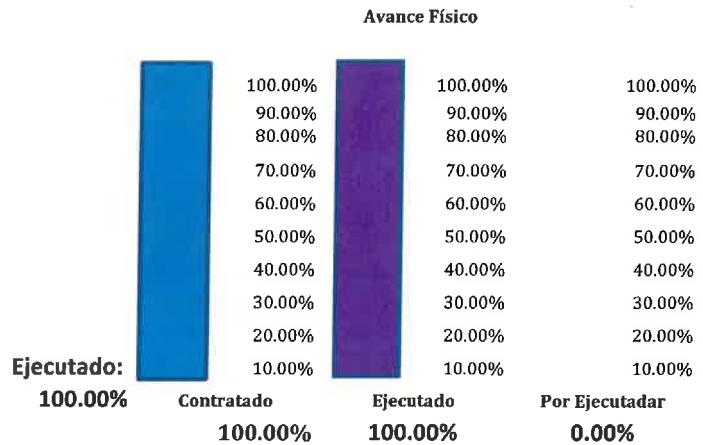

ELABORO:

P.ING. ALEJANDRO CIAU

RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
