



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra:

MT-2309005.-PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COLONIA TUMBEN KAA

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FORTAMUN-DF/2019


SEGUNDO REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


1.00	TERRACERIA	\$ 1,229,328.39	\$ 1,229,328.39	0.00
2.00	PAVIMENTACION	\$ 1,440,277.93	\$ 1,440,277.93	0.00

\$ 2,669,606.33	\$ 2,669,606.32	\$ -
\$ 427,137.01	100.00%	0.00%
\$ 3,096,743.33		

Avance Físico

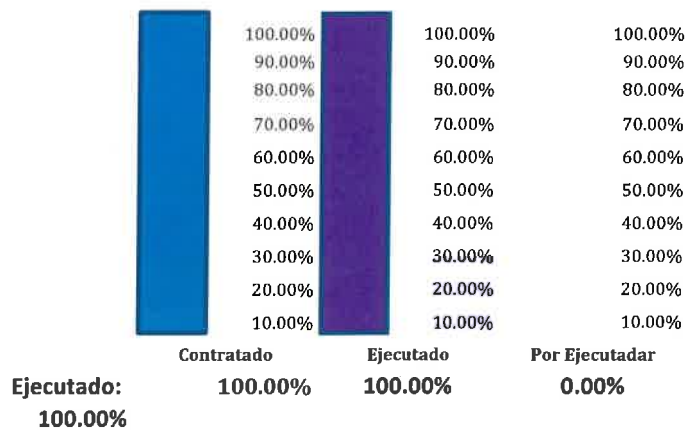

Avance Financiero

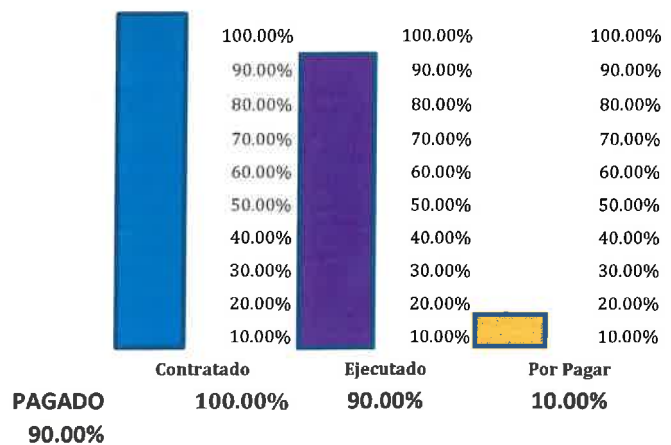

ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA
