



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ"

Obra:

Localidad: MACARIO GÓMEZ

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/035/RP/2019


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

**I CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE
MACARIO GÓMEZ**


A	PRELIMINARES	\$ 93,560.08	\$ 93,560.08	
B	CIMENTACION	\$ 178,956.70	\$ 178,956.70	
C	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	\$ 111,737.86	\$ 111,737.86	
D	ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA	\$ 1,253,185.89	\$ 1,253,185.89	
E	INSTALACIONES ELECTRICAS Y BAJANTES PLUVIALES	\$ 49,206.51	\$ 49,206.51	
F	EQUIPAMIENTO	\$ 84,372.24	\$ 84,372.24	
G	ACABADOS	\$ 381,480.49	\$ 381,480.49	

\$ 2,152,499.77	\$ 2,152,499.77	\$ -
\$ 344,399.96	100.00%	0.00%
\$ 2,496,899.73		

Avance Físico

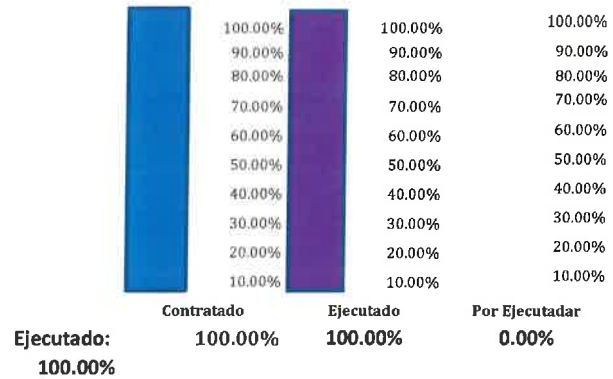

AVANCE FINANCIERO

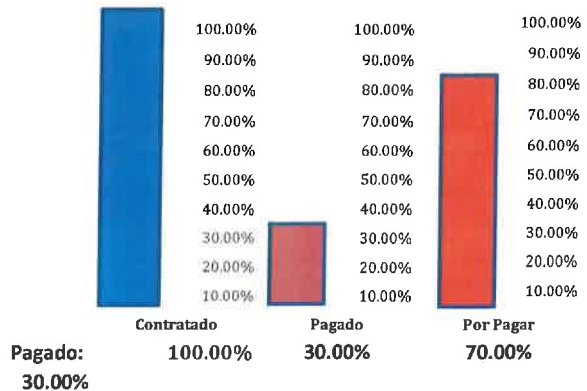

ELABORO:

ING. BENJAMÍN CHAN MAY
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
