



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL DIF DE LA COLONIA TUMBEN-KAA

Localidad: TULUM, QUINTANA ROO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/041/RP/2019

REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL DIF DE LA COLONIA TUMBEN-KAA


A	PRELIMINARES	\$ 54,874.91	\$ 54,874.91	0.00
B	CIMENTACION	\$ 316,325.43	\$ 316,325.43	0.00
C	ALBAÑILERIA	\$ 304,375.11	\$ 304,375.11	0.00
D	ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 448,580.16	\$ 448,580.16	0.00
E	ALBAÑILERIA T AZOTEA	\$ 191,059.56	\$ 191,059.56	0.00
F	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 546,395.31	\$ 546,395.31	0.00
G	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 39,450.86	\$ 39,450.86	0.00
H	INSTALACION SANITARIA	\$ 70,047.82	\$ 70,047.82	0.00
I	INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO	\$ 434,169.05	\$ 434,169.05	0.00
J	CARPINTERIA CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 224,350.11	\$ 224,350.11	0.00
K	AREA VERDE	\$ 222,214.43	\$ 222,214.43	0.00
L	RAMPA Y PASILLOS	\$ 136,243.62	\$ 136,243.62	0.00
M	LIBRANZA E INTERCONEXION	\$ 28,842.16	\$ 28,842.16	0.00
		\$ 3,016,928.53	\$ 3,016,928.53	0.00

TOTAL COMEDOR \$ 3,016,928.53 \$ 3,016,928.53 \$ -


\$ 3,016,928.53	\$ 3,016,928.53	\$ -
\$ 482,708.56	100.00%	0.00%
\$ 3,499,637.09		

TOTAL CONSTRUCCION DE DOMO

Avance Físico

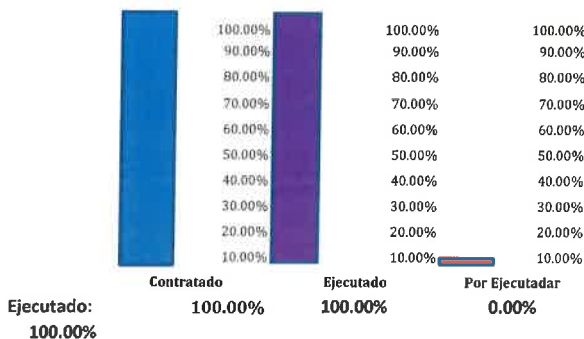

Avance Financiero

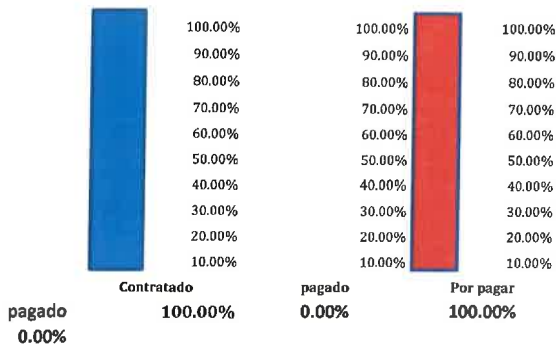

P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO
RESIDENTE DE OBRA.
