



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



**CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN LOCALIDADES  
Obra: RURALES DE MUNICIPIO DE TULUM.(MACARIO GÓMEZ, FRANCISCO UH  
MAY Y MANUEL ANTONIO AY)**

**Localidad: MACARIO GÓMEZ, FRANCISCO UH MAY Y MANUEL ANTONIO AY**

**Municipio: TULUM, QUINTANA ROO**

**Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/044/RP/2019**


**REPORTE**

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

MANUEL ANTONIO AY	\$ 1,130,632.61	\$ 1,130,632.61	0.00
FRANCISCO UH MAY	\$ 623,301.66	\$ 623,301.66	0.00
MACARIO GOMEZ	\$ 826,375.33	\$ 826,375.33	0.00

\$ 2,580,309.60	\$ 2,580,309.60	\$ -
\$ 412,849.54	100.00%	0.00%
\$ 2,993,159.14		

**Avance Físico**

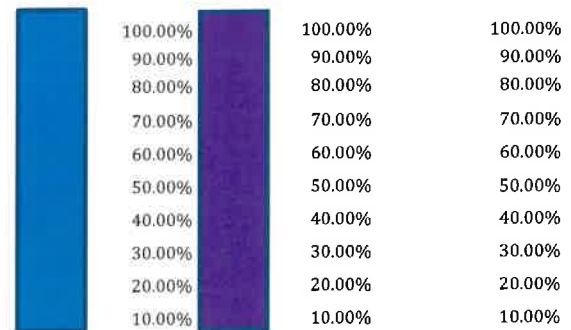

**Ejecutado:  
100.00%**

**Avance Financiero**



ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.  
RESIDENTE DE OBRA
