



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "AMPLIACIÓN Y REMODELACION DE LA AVENIDA COBA DE LA CARRETERA FEDERAL A BODEGA AURRERA".

Localidad: TULUM

TULUM A 11 DE JUNIO DEL 2020

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/005/RP/2020.

TERCER REPORTE


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I AMPLIACION Y REMODELACION DE LA AVENIDA COBA DE LA CARRETERA FEDERAL A BODEGA AURRERA				
A	PRELIMINARES	\$ 600,449.10		\$ 600,449.10
B	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	\$ 5,346,095.32		\$ 5,346,095.32
C	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 554,997.10		\$ 554,997.10
D	ALUMBRADO	\$ 169,454.00		\$ 169,454.00
E	PINTURA	\$ 206,723.12		\$ 206,723.12
		\$ 6,877,718.64	\$ -	\$ 6,877,718.64
		\$ 1,100,434.98	0.00%	100.00%
		\$ 7,978,153.62		

Avance Físico

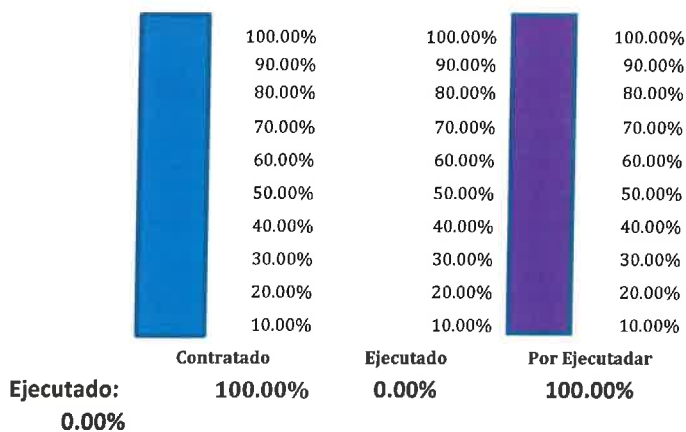

Avance Financiero

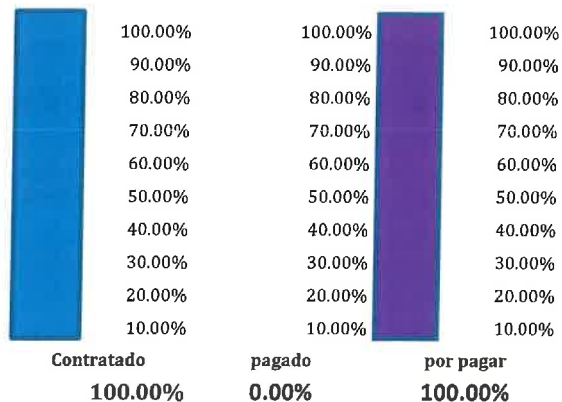

ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA
