



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obr: "MT-2309011- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
MACARIO GOMEZ"

Localidad: MACARIO GOMEZ

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

FECHA: 15/09/2020

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/013/FIEMDF/2020


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

**AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
MACARIO GOMEZ**


A	PRELIMINARES	\$ 33,942.42	\$ -	\$ 33,942.42
B	MEDIA TENSION	\$ 742,103.20	\$ -	\$ 742,103.20
C	BAJA TENSION	\$ 531,070.26	\$ -	\$ 531,070.26
D	RETENIDAS	\$ 53,793.18	\$ -	\$ 53,793.18
E	SISTEMA DE TIERRA FISICA	\$ 88,146.00	\$ -	\$ 88,146.00
F	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 279,683.54	\$ -	\$ 279,683.54
G	ENTREGA DE OBRA	\$ 57,899.30	\$ -	\$ 57,899.30

	\$ 1,786,627.90	\$ -	\$ 1,786,627.90
16 % IVA	\$ 285,862.86	0.00%	100.00%
TOTAL	\$ 2,072,490.76		

Avance Físico

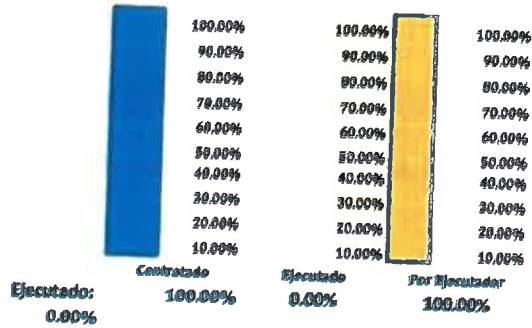

AVANCE FINANCIERO

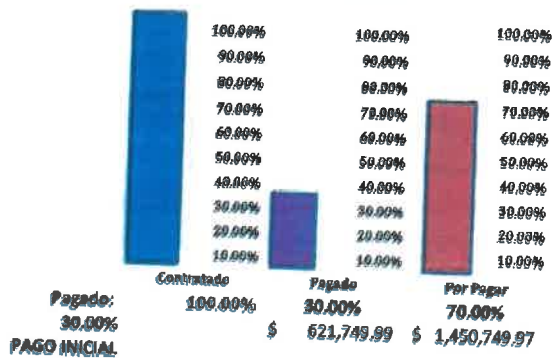

ELABORÓ:

ING. BENJAMIN CHAN MAY
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
