



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "MT-2309013.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
MANUEL ANTONIO AY"

Localidad: MANUEL ANTONIO AY
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

FECHA: 15/09/2020



Contrato: HAT/DGOVSPM/COPLP/017/FISMDP/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

**AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
MANUEL ANTONIO AY**

A	PRELIMINARES	\$ 30,975.20	\$ -	\$ 30,975.20
B	MEDIA TENSION	\$ 624,784.49	\$ -	\$ 624,784.49
C	BAJA TENSION	\$ 412,620.34	\$ -	\$ 412,620.34
D	REVENIDAS	\$ 53,668.71	\$ -	\$ 53,668.71
E	SISTEMA DE TIERRA FISICA	\$ 60,749.92	\$ -	\$ 60,749.92
F	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 185,066.08	\$ -	\$ 185,066.08
G	ENTREGA DE OBRA	\$ 77,929.62	\$ -	\$ 77,929.62

	\$ 1,446,804.46	\$ -	\$ 1,446,804.46
16 % IVA	\$ 231,488.71	0.00%	100.00%
TOTAL	\$ 1,678,293.17		

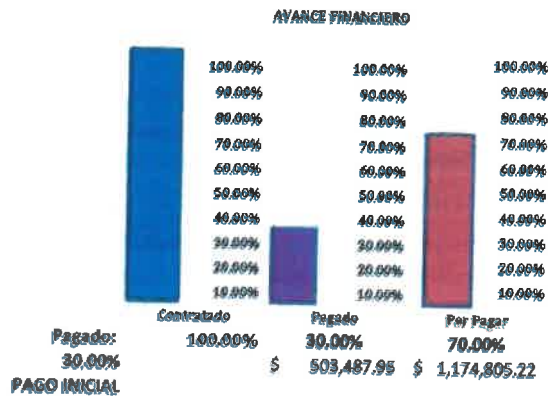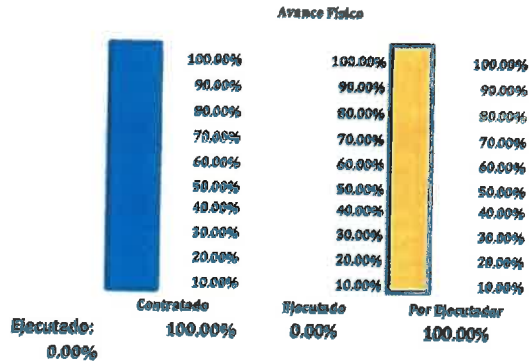

ELABORÓ:

ING. BENJAMÍN CHAN MAY
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
