



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: "MT-2309014.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COBA"

Localidad: COBA



Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

FECHA: 15/09/2020

Contrato: MAT/DGOVPM/CDPLP/019/FISMDF/2020

| CLAVE | PARTIDA | CONTRATADO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
|--|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COBA | | | | |
| A | PRELIMINARES | \$ 50,168.96 | \$ - | \$ 50,168.96 |
| B | MEDIA TENSION | \$ 764,112.74 | \$ - | \$ 764,112.74 |
| C | BAJA TENSION | \$ 428,504.47 | \$ - | \$ 428,504.47 |
| D | RETENIDAS | \$ 69,244.64 | \$ - | \$ 69,244.64 |
| E | SISTEMA DE TIERRA FISICA | \$ 61,698.00 | \$ - | \$ 61,698.00 |
| F | ALUMBRADO PUBLICO | \$ 332,598.10 | \$ - | \$ 332,598.10 |
| G | ENTREGA DE OBRA | \$ 77,134.80 | \$ - | \$ 77,134.80 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-------|-----------------|
| | \$ 1,783,461.41 | \$ - | \$ 1,783,461.41 |
| 16 % IVA | \$ 285,353.83 | 0.00% | 100.00% |
| TOTAL | \$ 2,068,815.24 | | |

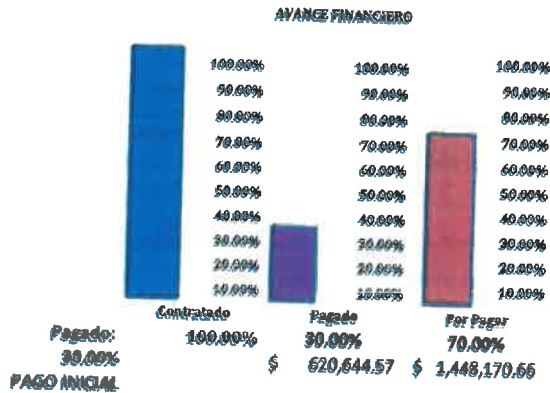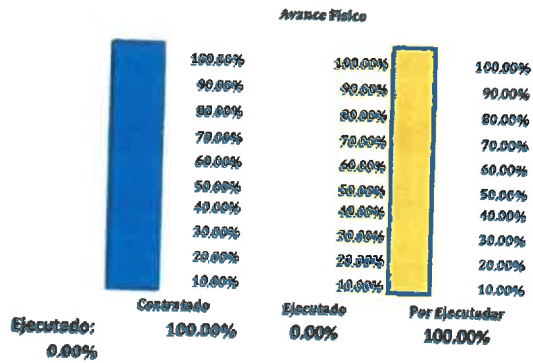

ELABORÓ:

ING. BENJAMÍN CHAN MAY
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
