



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "MT-2309D12.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY"



Localidad: FRANCISCO UH MAY  
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

FECHA: 15/05/2020

Contrato: NAT/DGOVSPM/COPAD/020/FISMDF/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	FOR EJECUTAR
I	<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY</b>			
A	PRELIMINARES	\$ 54,746.34	\$ -	\$ 54,746.34
B	MEDIA TENSION	\$ 854,108.87	\$ -	\$ 854,108.87
C	BAJA TENSION	\$ 288,504.35	\$ -	\$ 288,504.35
D	RETENIDAS	\$ 32,466.68	\$ -	\$ 32,466.68
E	SISTEMA DE TIERRA FISICA	\$ 41,111.82	\$ -	\$ 41,111.82
F	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 93,175.40	\$ -	\$ 93,175.40
G	ENTREGA DE OBRA	\$ 74,254.00	\$ -	\$ 74,254.00

	\$ 1,439,357.46	\$ -	\$ 1,439,357.46
16 % IVA	\$ 230,298.79	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	\$ 1,669,656.25		

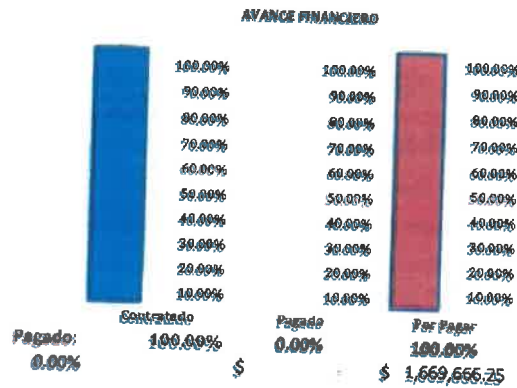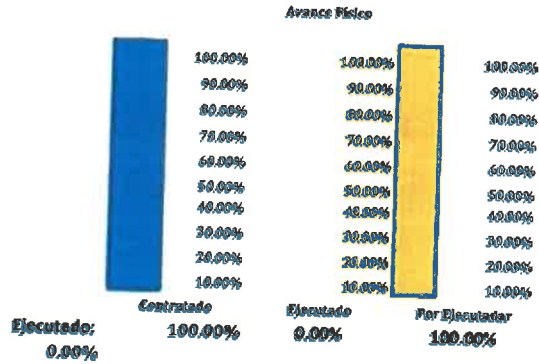

ELABORÓ

ING. BENJAMÍN CHAN MAY  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
