



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



"MT-2309009. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS,

Obra: LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA AVENIDA COBA DE LA

CARRETERA FEDERAL HASTA BODEGA AURRERA"

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

TULUM A 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contrato: HAT/DGOVSPM/COPLP/009/FISMDF/2020


TERCER REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


**"MT-2309009. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,
BANQUETAS, LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE
LA AVENIDA COBA DE LA CARRETERA FEDERAL HASTA
BODEGA AURRERA"**

A	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 1,411,771.33		\$ 1,411,771.33
B	ALUMBRADO	\$ 813,560.40		\$ 813,560.40
C	MOBILIARIO	\$ 92,054.95		\$ 92,054.95
E	PINTURA	\$ 238,836.69		\$ 238,836.69
		\$ 2,556,223.37	\$ -	\$ 2,556,223.37
		\$ 408,995.74	0.00%	100.00%
		\$ 2,965,219.11		

Avance Físico

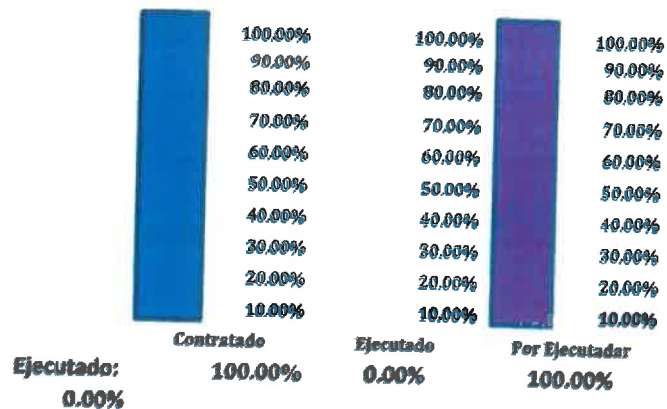

Avance Financiero

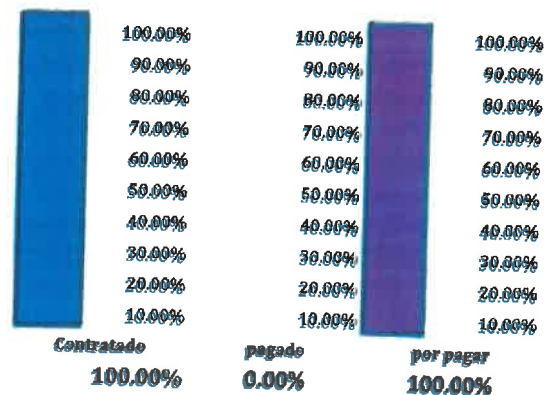

ELABORO:

**P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO,
RESIDENTE DE OBRA**
