



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



"MT-2309004.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO"

Localidad: CHANCHEN PRIMERO
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO
Contrato: HAT/DCOYFFM/COPLP/014/7ISMDF-BENEFICIARIOS/2020

REPORTE

FECHA: 14/09/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

"MT-2309004.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO"


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 2,700.87	\$ -	\$ 2,700.87
B	CIMENTACION	\$ 179,430.37	\$ -	\$ 179,430.37
C	ALBAÑILERIA	\$ 121,062.93	\$ -	\$ 121,062.93
D	ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 240,159.46	\$ -	\$ 240,159.46
E	ALBAÑILERIA Y AZOTEA	\$ 63,195.97	\$ -	\$ 63,195.97
F	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 270,443.13	\$ -	\$ 270,443.13
G	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 1,640.28	\$ -	\$ 1,640.28
H	INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO	\$ 39,831.64	\$ -	\$ 39,831.64
I	CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 54,806.56	\$ -	\$ 54,806.56
J	PLACA	\$ 4,697.20	\$ -	\$ 4,697.20
	TOTAL CUARTOS CHANCHEN PRIMERO	\$ 985,928.30	\$ -	\$ 985,928.30

\$ 985,928.30	\$ -	\$ 985,928.30
---------------	------	---------------


TOTAL CUARTOS CHANCHEN PRIMERO

0.00% 100.00%

Avance Físico

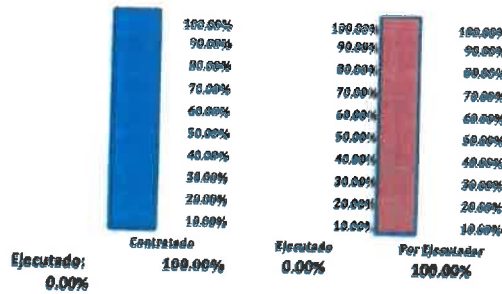

Avance Financiero

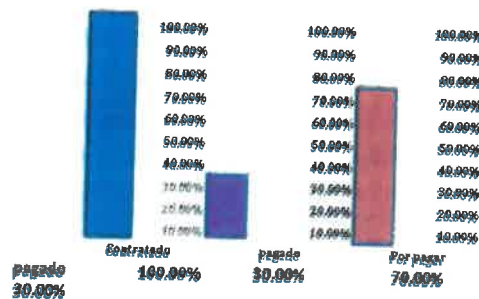

P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO
RESIDENTE DE OBRA.
