



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



"MT-2309807.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE"

Localidad: YAXCHE

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/021/FIRMADE-BENEFICIARIOS/2020

REPORTE

FECHA:

15/09/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

"MT-2309807.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE"

A	PRELIMINARES	\$ 2,403.00	\$	2,403.00
B	CIMENTACION	\$ 150,164.66	\$	150,164.66
C	ALBAÑILERIA	\$ 101,673.56	\$	101,673.56
D	ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 251,118.05	\$	251,118.05
E	ALBAÑILERIA Y AZOTEA	\$ 63,767.19	\$	63,767.19
F	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 320,094.07	\$	320,094.07
G	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 2,072.84	\$	2,072.84
H	INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO	\$ 26,504.52	\$	26,504.52
I	CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 4,821.32	\$	4,821.32
J	PLACA	\$ 984,784.13	\$	984,784.13


TOTAL CUARTOS YAXCHE

\$ 984,784.13	\$	\$ 984,784.13
---------------	----	---------------


TOTAL CUARTOS YAXCHE

\$ 984,784.13	0.00%	100.00%
---------------	-------	---------

Avance Físico

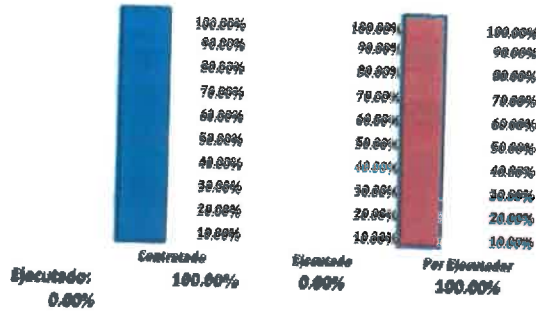

Avance Financiero

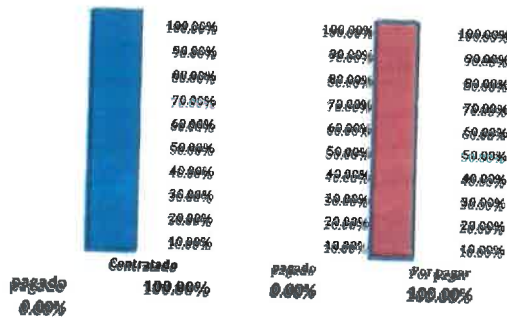

P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO
RESIDENTE DE OBRA.
