



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**





Obra: "REHABILITACIÓN DE PARQUES EN COMUNIDADES (MACARIO GÓMEZ, FRANCISCO UH MAY, MANUEL ANTONIO AY)"

Localidad: VARIAS

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/037/RP/2019

| CLAVE | PARTIDA | CONTRATADO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| REHABILITACIÓN DE PARQUES EN COMUNIDADES (MACARIO GÓMEZ, FRANCISCO UH MAY, MANUEL ANTONIO AY) | | | | |
| I | | | | |
| 1.1 | MANUEL ANTONIO AY | | | |
| A | PRELIMINARES | \$ 1,535,655.41 | \$ 1,535,655.41 | |
| B | ANDADORES | \$ 136,884.22 | \$ 136,884.22 | |
| C | AREA VERDE | \$ 582,472.70 | \$ 582,472.70 | |
| 1.2 | FRANCISCO UH MAY | | | |
| D | PRELIMINARES | \$ 424,988.33 | \$ 424,988.33 | |
| E | ANDADORES | \$ 78,672.59 | \$ 78,672.59 | |
| F | AREA VERDE | \$ 199,252.86 | \$ 199,252.86 | |
| 1.3 | MACARIO GÓMEZ | | | |
| G | PRELIMINARES | \$ 537,893.39 | \$ 537,893.39 | |
| H | ANDADORES | \$ 115,429.18 | \$ 115,429.18 | |
| I | AREA VERDE | \$ 257,458.43 | \$ 257,458.43 | |
| | | \$ 3,868,707.11 | \$ 3,868,707.11 | \$ - |
| | | \$ 618,993.14 | 100.00% | 0.00% |
| | | \$ 4,487,700.25 | | |

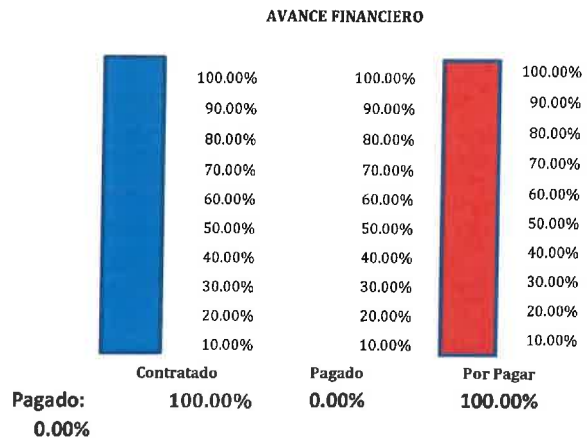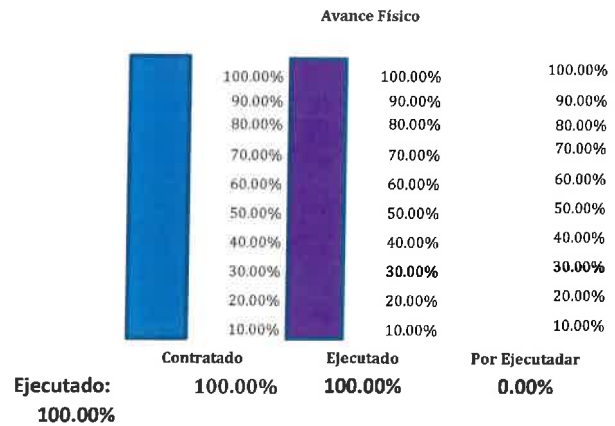

ELABORO:

ING. BENJAMÍN CHAN MAY
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
