DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD

MT-2309011.-"PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA XUL-KAA"

REPORTE

Localidad: TULUM, QUINTANA ROO
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO
Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/036/FISM-DF/2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
	MT-2309011.-"PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA XUL-KAA"			
A	TERRACERIAS	$ 705,190.52	$ 705,190.52	0.00
B	PAVIMENTOS	$ 1,615,529.32	$ 1,615,529.32	0.00
				0.00
	TOTAL COMEDOR	$ 2,320,719.84	$ 2,320,719.84	$ -
		$ 2,320,719.84	$ 2,320,719.84	$ -
		$ 371,315.17	100.00%	0.00%
	TOTAL CONSTRUCCION DE DOMO	$ 2,692,035.01		

Avance Físico

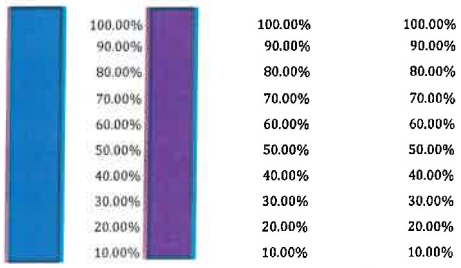

	Contratado	Ejecutado	Por Ejecutadar
Ejecutado: 100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Avance Financiero

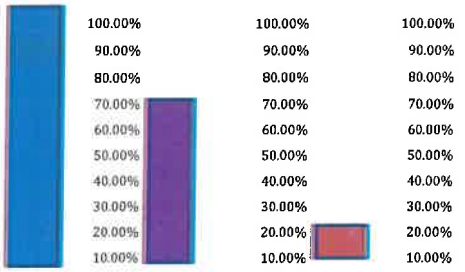

	Contratado	pagado	Por pagar
pagado 73.79%	100.00%	73.79%	26.21%

P.ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO
RESIDENTE DE OBRA.
